




MOSTOSTAL Zabrze
Holding S.A.



Zadaszenie widowni oraz niezbedna infrastruktura techniczna Stadionu Slaskiego w Chorzowie

Kontrakt nr 2374/IW/2009
Zamowienie nr ZP/C/2/2008

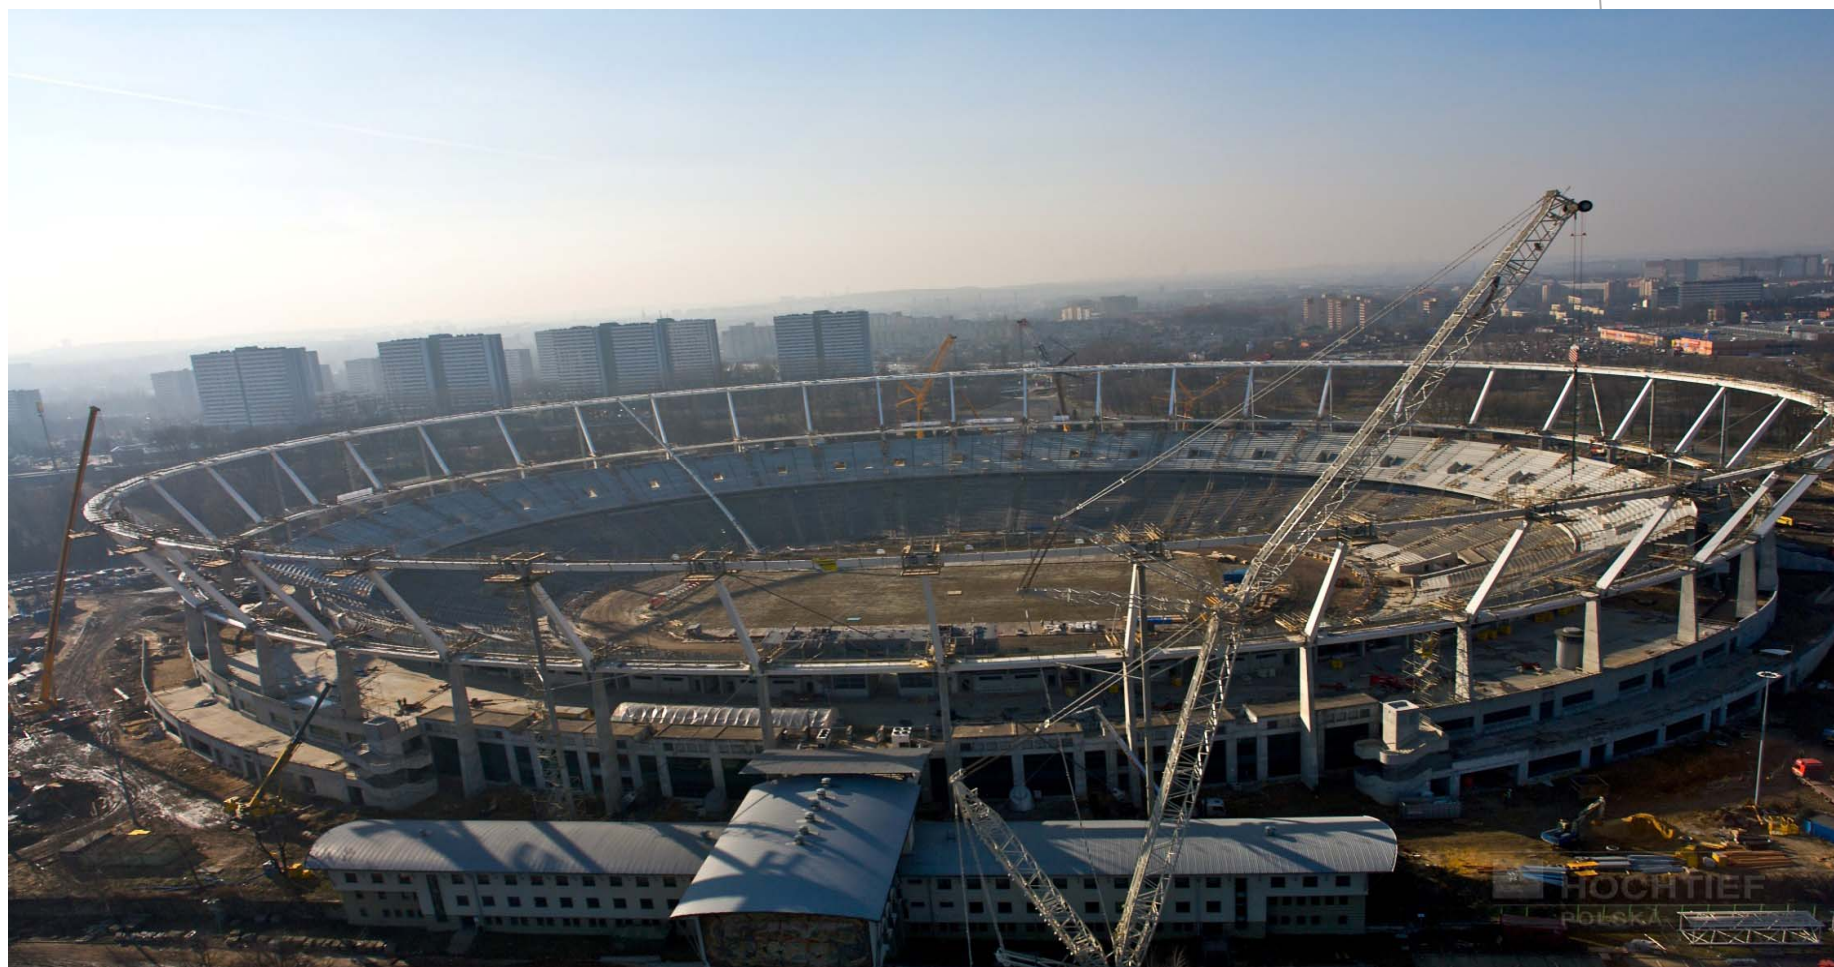

Zasypy murów oporowych

- ✓ Wykonano (do 15.02.2011r.) ~ 33 000m³
- ✓ Pozostało ~ 12 000m³



Wyciągnięcie grodzic stalowych

- ✓ Średnia długość grodzicy – 12mb
- ✓ Łączna długość ścian z grodzic ~ 200 mb



Płyta promenady

- ✓ Łączna powierzchnia promenady - 13 500m²
- ✓ Wykonano (do 15.02.2011) ~ 11 000m²



Wywóz pozostałego urobku z makroniwelacji

- ✓ Łączna ilość urobku – 100 000m³
- ✓ Wywieziono ~ 90 000m³



Naprawa dylatacji nad częścią Administracyjną TW

- ✓ Łączna długość dylatacji ~ 3750 mb
- ✓ Wykonano (do 15.02.2011) ~ 750mb



Instalacje mechaniczne, elektryczne, teletechniczne

Trybuna Wschodnia - Zachodnia



Roboty pozostałe do wykonania

- ✓ Montaż krzesełek + uzupełnienie konstrukcji ~ 55 000szt
- ✓ Bariery między sektorami oraz balustrady
- ✓ Posadzki na Trybunie Zachodniej –
 - Posadzki przemysłowe ~ 15 000m²
 - Posadzki jastrychowe ~ 3 500m²
- ✓ Roboty wykończeniowe na Trybunie Wschodniej
 - Sucha zabudowa
 - Tynkowanie
 - Malowanie
 - Sufity podwieszane
 - Ślusarka drzwiowa i okienna
- ✓ Drogi, elementy zewnętrzne
 - Ciągi komunikacyjne z betonu asfaltowego ~ 24 000m²
- ✓ Instalacje teletechniczne
 - SAP, DSO, SSWiN, KD, CCTV, LAN, IT, Nagłośnienie, TV, BMS
- ✓ Instalacje mechaniczne
- ✓ Instalacje elektryczne



**Dziękujemy
za uwagę**
